
产品研发规划V0.1

开发背景

本次开发产品为消防物联网系统 该系统主要分为:

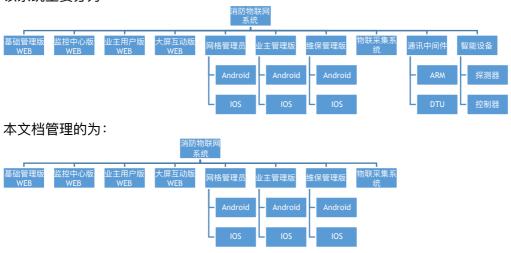

项目规划

本次产品开发计划分为三个阶段进行:

第一阶段: 【S】1.31截止。

目标:

- 大屏互动版开发完成;
- 实现大屏与智能硬件系统联动反应;
- 基础管理版WEB基本功能开发完成;
- 监控中心版WEB基本功能开发完成;
- 业主用户版WEB基本功能开发完成;
- 网格管理员Android版开发完成;
- 物联采集系统开发完成(MQTT);

第二阶段: 【A】放假前。

目标:

- 实现统计分析功能;
- 实现报表管理与展示功能;
- 实现日、周、月报展示及推送功能;

第三阶段: 【B】3.1截止。

目标:

- 实现基础管理版WEB未完成功能;
 - 单位管理:指挥中心、维保单位、施工单位、生产厂商
 - 权限管理:操作管理
 - 物料管理: 摄像头管理、RFID管理、楼层管理、厂商型号关系
 - 通讯管理:部件测点管理、施工通讯测试
 - 资讯管理:系统公告
 - 基础信息
 - 文件管理
 - 日志管理
 - 系统管理:推送通道管理、数据备份、文件备份、日志整理
- 实现监控中心版WEB未完成功能;
 - 单位信息:隧道、避难层、储存物
 - 单位信息:消防设施管理:消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防烟 排烟系统、防火门帘系统、消防应急广播系统、应急照明及疏散指示系 统、灭火器、消防电梯、消防专用电话
 - 巡查监管: 防火巡查标准
- 实现业主用户版WEB未完成功能;
 - 单位信息:消防设施管理:消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防烟 排烟系统、防火门帘系统、消防应急广播系统、应急照明及疏散指示系 统、灭火器、消防电梯、消防专用电话
 - 巡查监管: 防火巡查标准
 - 消防业务: 查岗记录[自查]、设施检测
 - 系统管理:排班管理
- 实现业主管理版Android开发;
- 实现维保管理版Android开发;
- 实现网格管理版IOS开发;
- 实现业主管理版IOS开发;
- 实现维保管理版IOS开发;
- 实现物联采集系统NB-IOT对接

三个阶段的划分依据:

- ➤ 时间紧迫
- ➤ 功能必要性
- ➤ 功能了解程度

内容及优先级



【S】基础管理版WEB



【S】单位管理

单位管理							
监控中心	消防部门	业主用户	网格单位	指挥中心	维保单位	施工单位	生产厂商
	$\overline{}$						

模块	优先级
监控中心	S
消防部门	S
业主用户	S
网格单位	S
指挥中心	В
维保单位	В
施工单位	В
生产厂商	В

【S】权限管理



模块	优先级
账号管理	S
角色管理	S
菜单管理	S
操作管理	В

【S】通讯管理



模块	优先级
通讯模块管理	S
部件模板管理	S
模板点位管理	S
部件测点管理	В
施工通讯测试	В

【B】基础信息



模块	优先级
摄像头管理	В
RFID标签管理	В

楼层管理	В
厂商型号关系	В

【S】资讯管理



模块	优先级
消防法规	S
消防常识	S
消防视频	S
系统公告	В

【B】文件管理



模块	优先级
文档管理	В
照片管理	В
图档管理	В
录音管理	В
视频管理	В

【B】日志管理



模块	优先级
系统运行日志	В
火警事件日志	В
报警事件日志	В
预警事件日志	В
故障事件日志	В
状态事件日志	В
防火巡查日志	В
设施维保日志	В
火警受理日志	В
随机查岗日志	В

【S】系统管理

		系统管理		
字曲管理	推送诵道	数据条份	文件各份	口士敕珊
于兴旨垤	推区地位	数加田川	文件画加	口心罡垤

模块	优先级
字典管理	S
推送通道	В
数据备份	В
文件备份	В
日志整理	В

【S】监控中心版WEB



【S】单位信息



模块	优先级
业主单位信息	S
建构筑物管理	S
建筑隧道管理	В
避难层管理	В
安全出口管理	S
消防电梯管理	S
储存物管理	В
毗邻建筑管理	S
建筑相关图档	S
重点部位管理	S
消防设施管理	S
微型消防站	S
业务人员管理	S

【S】单位监管


模块	优先级
查岗管理	S
查岗记录	S
巡查任务	S
培训任务	S
演练任务	S
整改通知	S
火警受理	S
火灾信息	S

【S】联网监控



模块	优先级
火灾自动报警	S
电气火灾监控	S
消防水源监测	S
消防电源监测	S
防火门帘监控	S
消防视频监控	S
智慧用电监测	S
远程控制	S

【S】巡查监管



模块	优先级
防火巡查记录	S
隐患治理状况	S
防火巡查标准	В

【A】统计分析

【S】宣传教育

宣传教育 消防法规 消防常识 消防视频

模块	优先级
消防法规	S
消防常识	S
消防视频	S

【S】系统管理



模块	优先级
监控人员管理	S

【S】个人管理



模块	优先级
个人管理	S

【S】业主用户版WEB



【A】运行概况

【S】单位信息



模块	优先级
业主单位信息[FORM表单]	S
建构筑物管理	S
建筑隧道管理	В
避难层管理	В
安全出口管理	S
消防电梯管理	S
储存物管理	В
毗邻建筑管理	S
建筑相关图档	S
重点部位管理	S
消防设施管理	S
微型消防站	S
设施部件管理	S

【S】消防业务



模块	优先级
视频监控	S
查岗记录[自查]	В
培训任务	S
演练任务	S
设施检测	В

【S】消防监管


模块	优先级
查岗记录	S
整改通知	S
火警受理	S
火灾信息	S

【S】联网监控



火灾自动报警	S
电气火灾监控	S
消防水源监测	S
消防电源监测	S
防火门帘监控	S
消防视频监控	S
智慧用电监测	S
远程控制	S

【S】巡查监管



模块	优先级
防火巡查任务	S
防火巡查记录	S
隐患治理状况	S
防火巡查标准	В
巡检点管理	S

【A】统计分析

【S】宣传教育



模块	优先级
消防法规	S
消防常识	S
消防视频	S

【S】系统管理




模块	优先级		
业务人员管理	S		
值班排班管理	В		

【S】个人管理




模块	优先级
个人管理	S

【S】大屏互动版WEB

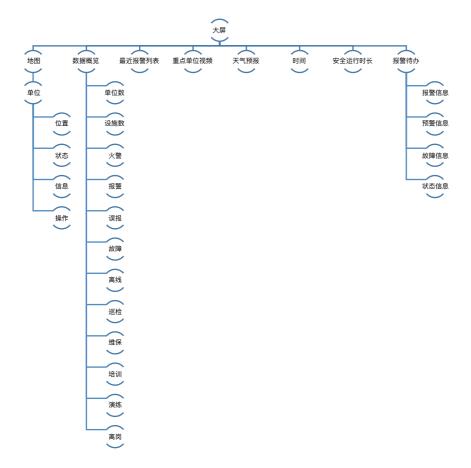

- 【S】网格管理员Android
- 【B】网格管理员IOS
- 【B】业主管理版Android
- 【B】业主管理版IOS
- 【B】维保管理版Android
- 【B】维保管理版IOS
- 【S】物联采集系统



模块		优先级	开始	结束	
协议对接	安易云通讯协议	MQTT	S		
	NB-IOT		В		
数据采集	实时数据		S		
	告警事件	报警	S		
	, i	预警	S		
	装置故障		S		
	装置状态		S		
业务计算	定制触发		S		
	峰值、时		S		
	谷值、时		S		

	均值		А	
	•••		Α	
数据存储	存储方式	REDIS	S	
		MySQL	S	
		MongoDB	S	
		降频存储	A	
	存储类型	实时库	S	
		历史库	S	
		事件库	S	
		报文库	А	
主动推送	事件推送		S	
	通道管理		A	
	推送记录		А	
	推送策略	流量控制	S	
		通道选择	А	
		业务订购	А	
通讯日志	原始日志		А	
集群架构	中间件		S	
	程序		S	
	存储		S	
